



(12月度)工事の説明(宇山地区改良他工事)



住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山地区にて、「改良他工事」を行っています。
引き続き、周辺への環境影響が極力少なくなるよう進めてまいりますので、
近隣皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

改良他工事

○工事名：洲本バイパス宇山地区改良他工事

○工事場所：洲本市宇山2丁目

○工期：令和3年11月5日～令和5年2月28日

○工事内容：

- ・掘削工：23,470m³
- ・法面整形工：3,988m²
- ・残土処理工：1式
- ・舗装工：1,240m²
- ・石ブロック積(張)工：1式
- ・構造物撤去工：1式
- ・盛土工：11,520m³
- ・大型土のう250袋
- ・擁壁工：1式
- ・防護柵工：1式
- ・仮設工：1式

(12月)工事の予定

R4.12月	5	10	15	20	25	31	備考
準備工	[Bar chart showing work from 5th to 31st]						
法面工	[Bar chart showing work from 5th to 25th]						
防護柵工	[Bar chart showing work from 25th to 31st]						
舗装工	[Bar chart showing work from 25th to 31st]						
交通誘導 警備員	[Bar chart showing work from 5th to 31st]						市道宇山ヶ谷線

○作業時間：8：00～17：00

○年末年始休暇：12/29～1/4

状況写真(撮影日：R4.11.11)



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886

改良他工事 現場代理人・監理技術者：村上 美昭



(12月度)工事の説明(宇山地区函渠設置工事)



住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山地区にて、「函渠設置工事」を行っています。

- ・側壁コンクリート(2回目)打設を、12月2日に予定しています。
- ・コンクリート打設の日は、生コン車が約60台程度通行します。

函渠設置工事

○工事名：洲本バイパス宇山地区函渠設置工事

○工事場所：洲本市宇山2丁目

○工期：令和4年3月9日～令和5年3月30日

○工事内容：

- ・道路土工(掘削、法面整形、残土処分)：8,840m³【完了】
- ・カルバート工(場所打函渠工)：1,549m³【施工中】
- ・仮設工(法面吹付工、鉄筋挿入工他)：1,611m²【完了】


(12月)工事の予定

工種	令和4年12月						備考
	5	10	15	20	25	31	
加保工							
底板	【完了】						
側壁	[Bar chart showing work from 2nd to 31st]						足場・鉄筋・型枠組立 コンクリート打設
頂板	[Bar chart showing work from 2nd to 31st]						

○作業時間：8：00～17：00

○年末年始休暇：12/29～1/4

一般図

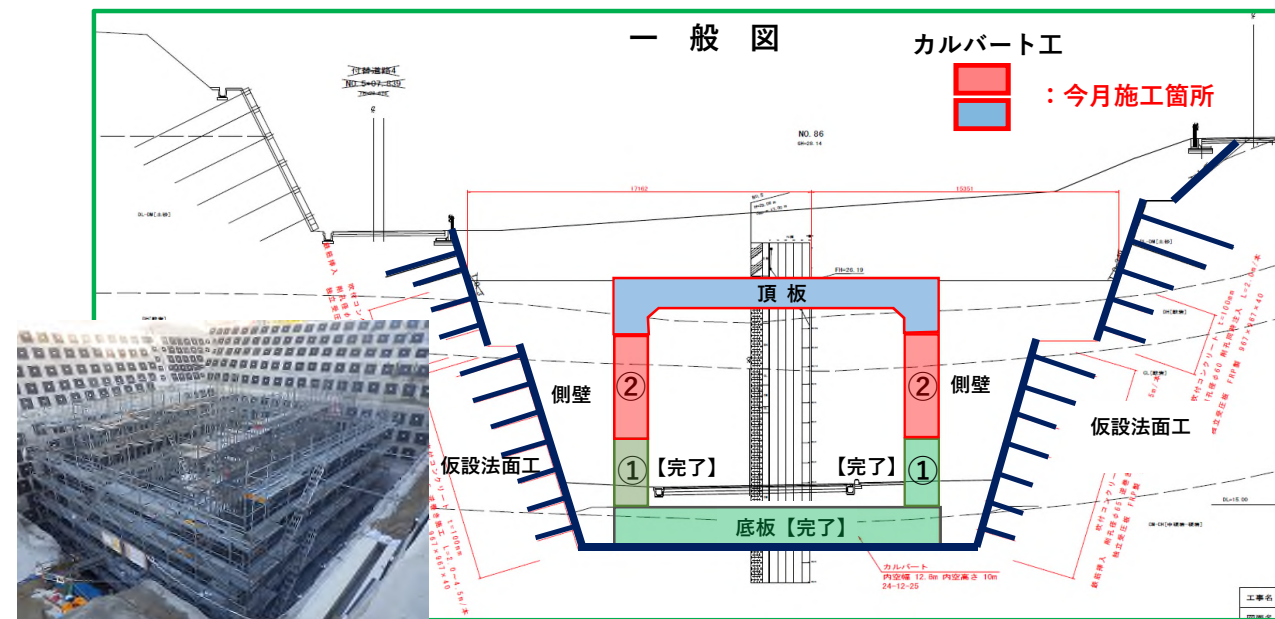

状況写真(撮影日：R4.11.22)

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 神崎組 ☎0792-23-2025

作業事務所 住所：洲本市栄町2丁目3-32 宇山ビル201 ☎0799-53-6345

現場代理人：尾中 栄次, 監理技術者：石堂 健人

