



# (1月度)工事の説明(宇山地区改良他工事)

令和5年1月度



## 住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山地区にて、「改良他工事」を行っています。引き続き周辺への環境影響が極力少なくなるよう進めてまいりますので、近隣皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

### 改良他工事

- 工事名：洲本バイパス宇山地区改良他工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和3年11月5日～令和5年2月28日（予定）
- 工事内容：
  - ・掘削工：23,470m<sup>3</sup>
  - ・法面整形工：3,988m<sup>2</sup>
  - ・残土処理工：1式
  - ・舗装工：1,240m<sup>2</sup>
  - ・石ブロック積(張)工：1式
  - ・構造物撤去工：1式
  - ・盛土工：11,520m<sup>3</sup>
  - ・大型土のう250袋
  - ・擁壁工：1式
  - ・防護柵工：1式
  - ・仮設工：1式

### (1月)工事の予定

R5.1月	5	10	15	20	25	30	備考
準備工	年 末 年 始 休 暇						
防護柵工	[施工期間]						
交通誘導警備員	12/29~1/4 市道宇山石ヶ谷線						

○作業時間：8：00～17：00  
○年末年始休暇：12月29日～1月4日

状況写真（撮影日：R4.12.12）



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886

改良他工事 現場代理人・監理技術者：村上 美昭



# (1月度)工事の説明(宇山地区函渠設置工事)

令和5年1月度



## 住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山地区にて、「函渠設置工事」を行っています。  
・頂版コンクリート打設を、1月18日に予定しています。（雨天の場合は24日に延期）  
・コンクリート打設の日、生コン車が約150台程度通行します。

### 函渠設置工事

- 工事名：洲本バイパス宇山地区函渠設置工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和4年3月9日～令和5年3月30日
- 工事内容：
  - ・道路土工(掘削、法面整形、残土処分)：8,840m<sup>3</sup>【完了】
  - ・カルバート工(場所打函渠工)：1,549m<sup>3</sup>【施工中】
  - ・仮設工(法面吹付工、鉄筋挿入工他)：1,611m<sup>2</sup>【完了】

### (1月)工事の予定


月日	令和5年1月							備考
工程	5	10	15	20	25	31		
カルバート工	年 末 年 始 休 暇							
底板	[完了]							
側壁	[完了]							足場・鉄筋・型枠組立
頂版	1/18 頂版カルバート打設予定(雨天の場合は1/24)							コンクリート打設
土留壁	12/30~1/4							

○作業時間：8：00～17：00  
○年末年始休暇：12月30日～1月4日

### 一般図

### カルバート工

■：今月施工箇所

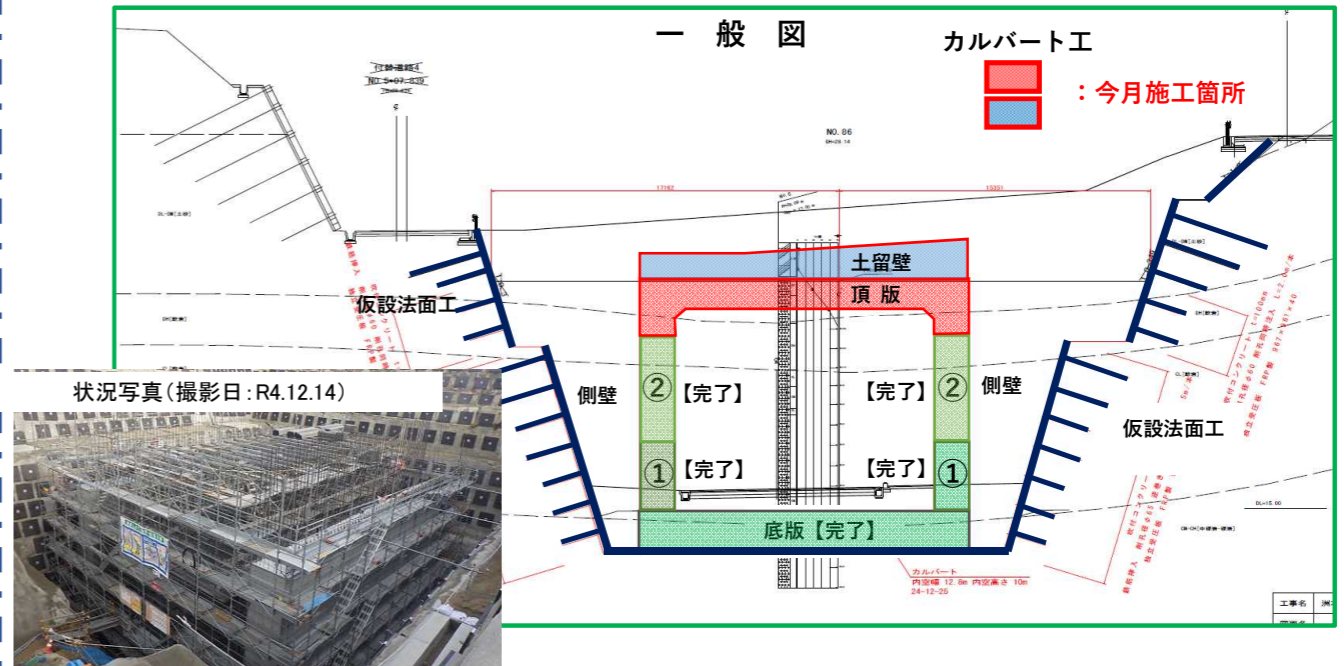

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 神崎組 ☎0792-23-2025

作業事務所 住所：洲本市栄町2丁目3-32 宇山ビル201 ☎0799-53-6345

現場代理人：尾中 栄次，監理技術者：石堂 健人

