

工事ビラ (2月度) 洲本バイパス炬口地区改良その他工事

作成日 H31.1.25

■ 工事概要

住民の皆様へ

炬口地区において、洲本バイパスの整備事業の工事を進めております。工事期間中におきましては、粉塵や濁水等についても周辺への影響が少なくなるよう細心の注意を払い施工してまいります。皆様の、ご理解とご協力を、お願い致します。

工事場所 兵庫県洲本市炬口地先(旧赤岩公園)
 工期 平成30年3月1日～平成31年3月20日
 作業時間 平日 8:00～17:00

(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)

施工者 **但南建設 株式会社**
 現場事務所所長(兼)現場代理人:善積 崇 監理技術者:中尾 卓也
 現場事務所(炬口漁港内) ☎ 0799-20-4950 fax 0799-20-7226




【工事内容】

・掘削工:36,140m³、残土処理工:36,140m³、コンクリート吹付工:523m²
 ・法枠工:991m²、アンカー工:936m、鉄筋挿入工:222本、排水工:335m

【作業内容 今月(2月)作業予定】

- ・法面工(第4法面:鉄筋挿入工、第3法面:法枠工・鉄筋挿入工)
- ・小段排水工(第4法面小段)
- ・掘削工(第3法面)
- ・残土運搬工

○出入口には交通誘導警備員3名配置し、タイヤ泥対策としてタイヤ洗浄機(スパッツ)を設置し環境配慮に努めます。
 ○ダンプトラックは、ゼッケンを取付け関係車両明示すると共に荷台には養生シートにて飛散防止に努めます。



【関係車両明示ゼッケン】

■ 現在の施工状況

※現在の施工中箇所



施工範囲

【撮影日 H31.1.18】


■ 状況写真



第4アンカー工 (削孔状況)



第4法面起点側

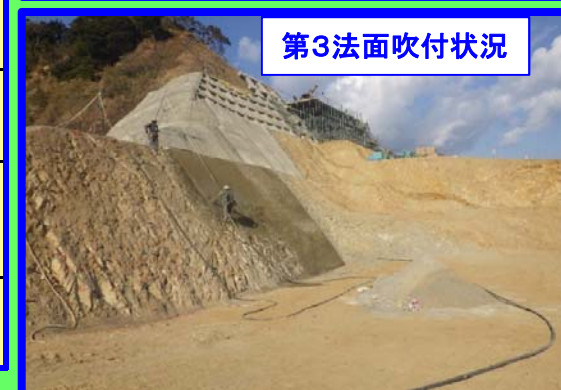

第3法面吹付状況



第4アンカー工 (注入プラント)

※ご迷惑をお掛けしますが、引続き御協力をお願い致します。

■ 工程表

2月	5	10	15	20	25	28	備考
法面工 (法枠工)			第3法面	—————			第3法面
法面工 (鉄筋挿入工)	第4法面	—————				第3法面	第3法面
小段排水工		第4法面	—————				第4法面小段
掘削工			第3法面	—————			第3法面
残土運搬				—————			洲本市道・宇山
交通誘導警備員				—————			出入口3名
